

C. LUIS ENRIQUE ALVAREZ CARLIN
AV. ORIENTE 31 EXT. 1943, No. INT. 2, C.P. 94300, ORIZABA, VER.

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION
DE LA EMPRESA AL H. AYUNTAMIENTO

EN EL MUNICIPIO DE ZENTLA, VER. SIENDO LAS 09:00 HRS. DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD EJIDO LA PIÑA (MAROMILLA), UBICADA EN ZENTLA, VER.

POR PARTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL Y H. AYUNTAMIENTO:

C.C. DR. RAFAEL LÓPEZ HERNÁNDEZ, L.C. LEONARDO ANDRÉS VALDIVIA BERISTAIN, ING. BERNARDINO ACOSTA LÓPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, CONTRALOR MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, RESPECTIVAMENTE.

Y POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA:

C. LUIS ENRIQUE ALVAREZ CARLIN (PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL)

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA- RECEPCION DE LA OBRA:

"REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DEL TEBA CON CONCRETO HIDRAULICO (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LA PIÑA"

DATOS DE LA OBRA:

NUMERO DE OBRA: 2023302000025	MODALIDAD DE CONTRATACION: (B)		
	(A) ADJUDICACION DIRECTA	(B) INVITACION RESTRINGIDA	(C) LICITACION PUBLICA
No. ANEXO DE APROBACION: 2023302000025	CALENDARIO DE OBRA		
MONTO DEL CONTRATO \$1,039,993.06	PROGRAMADA	FECHA DE INICIO 01/NOVIEMBRE/2023	FECHA DE TERMINO 30/NOVIEMBRE/2023
	REAL	01/NOVIEMBRE/2023	30/NOVIEMBRE/2023
No. DE CONTRATO: MZV-DOP-015- FAISMUN-2023/0025	TIPO DE FIANZA: VICIOS OCULTOS		
	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MÉXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.		
NUMERO DE FIANZA:			

INVERSION APROBADA				INVERSION APLICADA			
TOTAL	FAISMUN 2023	MPAL.	COM.	TOTAL	FAISMUN 2023	MPAL.	COM.
\$1,039,993.06	\$1,039,993.06	\$0.00	\$0.00	\$1,039,993.06	\$1,039,993.06	\$0.00	\$0.00

C. LUIS ENRIQUE ALVAREZ CARLIN
AV. ORIENTE 31 EXT. 1943, No. INT. 2, C.P. 94300, ORIZABA, VER.

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DEL TEBA CON CONCRETO HIDRAULICO (SEGUNDA ETAPA)			
		UNIDAD	CANTIDAD
	PRELIMINARES		
PRE-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO A BASE DE LONA IMPRESA CON LOGO DEL AYUNTAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, CON UNA SECCIÓN DE 1.00 X 1.50 MTS. FIJADA EN OBRA CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12.	PZA	1.00
PRE-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE TERMINACIÓN DE OBRA EN ALUMINIO IMPRESO TAMAÑO CARTA. INCLUYE: FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
PRE-003	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.	M ²	714.85
	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO		
PCH-001	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 50 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M ³	242.88
PCH-002	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA CON MÁQUINA Y DESCARGA A VOLTEO.	M ³	303.60
PCH-003	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO.	M ³ /KM	1,214.40
PCH-004	RENIVELACION, AFINE Y COMPACTACION DE LA TERRACERIA CON MAQUINARIA, INCLUYE: COMPACTACION SIN CONTROL DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M ²	485.76
PCH-005	BASE HIDRAULICA 70 - 30 % (GRAVA 1 1/2" - CEMENTANTE) DE 20 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95 % DE SU PVSM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M ²	485.76
PCH-006	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C=250.00 KG/CM2 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN, PARA ACCESOS, DE 18 CM. DE ESPESOR, TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", REVENIMIENTO DE APROXIMADAMENTE 10 CM. INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, MADO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M ²	485.76
	DENTELLÓN		
DEN-001	ELABORACIÓN DE DENTELLÓN DE 15 X 20 CM., CONCRETO F'C= 200 KG/CM2., ARMEX 15X20-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ACABADO COMUN, MANO DE OBRA, EQUIPO NECESARIO, MATERIALES, ACARREO A PRIMERA ESTACION A 20.00 M.	ML	13.90
	GUARNICIONES		

C. LUIS ENRIQUE ALVAREZ CARLIN
AV. ORIENTE 31 EXT. 1943, No. INT. 2, C.P. 94300, ORIZABA, VER.

GUA-001	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M ³	76.90
GUA-002	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	732.38
GUA-003	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA, TIPO TRÁFICO PESADO EN GUARNICIONES DE 15 CM. DE CORONA Y 10 CM. DE ALTURA, INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	732.38
	ALCANTARILLA DE CONCRETO ARMADO 8.22 X 0.72 X 0.60 METROS.		
GUA-001	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M ³	10.16
CIM-02	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F" C= 100 KG/CM2, DE 5 CMS DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.	M2	9.21
ALC-003	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL No. 3 (3/8"), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A 1A. ESTACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	KG	163.93
ALC-004	CIMBRA COMUN EN MURO DE ESTRUCTURA DE 0.15 M. DE ESPESOR Y ALTURA DE 0.80 M., A UNA ALTURA MAXIMA DE 1.00 M., ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A., ACABADO APARENTE, INCLUYE: AMBAS CARAS DE CIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	24.10
ALC-005	CONCRETO F'C= 200 KG/CM2., RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAX. 3/4", FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, INCLUYE ACARREOS A 1A. ESTACION A 20.00 M.	M ³	2.41
ALC-006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL (ÁNGULO DE 1/4" X 3", 7.29 KG/M), INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	681.32
BAN-001	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M ³	3.16
PCH-002	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA CON MÁQUINA Y DESCARGA A VOLTEO.	M ³	7.00
PCH-003	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO.	M ³ /KM	28.00

C. LUIS ENRIQUE ALVAREZ CARLIN
AV. ORIENTE 31 EXT. 1943, No. INT. 2, C.P. 94300, ORIZABA, VER.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL COMITÉ COMUNITARIO QUIEN SE COMPROMETE A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA.

EL ACTO DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA DE LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL H. AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE POR DERECHO LE CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS 09:45 HRS DEL DIA CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EN DOS TANTOS, DONDE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE TODAS LAS FOJAS QUIENES INTERVINIERON EN ELLA, DAMOS FE:

ENTREGA:

EL CONT RATISTA

C. LUIS ENRIQUE ALVAREZ CARLIN
PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

RECIBEN:

POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL Y H. AYUNTAMIENTO



L.C. LEONARDO ANDRÉS VALDIVIA BERISTAIN
CONTRALOR MUNICIPAL

DR. RAFAEL LÓPEZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTE DEL CDM


PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ZENTLA, VER.
2022-2025

ING. BERNARDINO ACOSTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. LUIS ENRIQUE ALVAREZ CARLIN
AV. ORIENTE 31 EXT. 1943, No. INT. 2, C.P. 94300, ORIZABA, VER.

REPORTE FOTOGRAFICO

ANTES

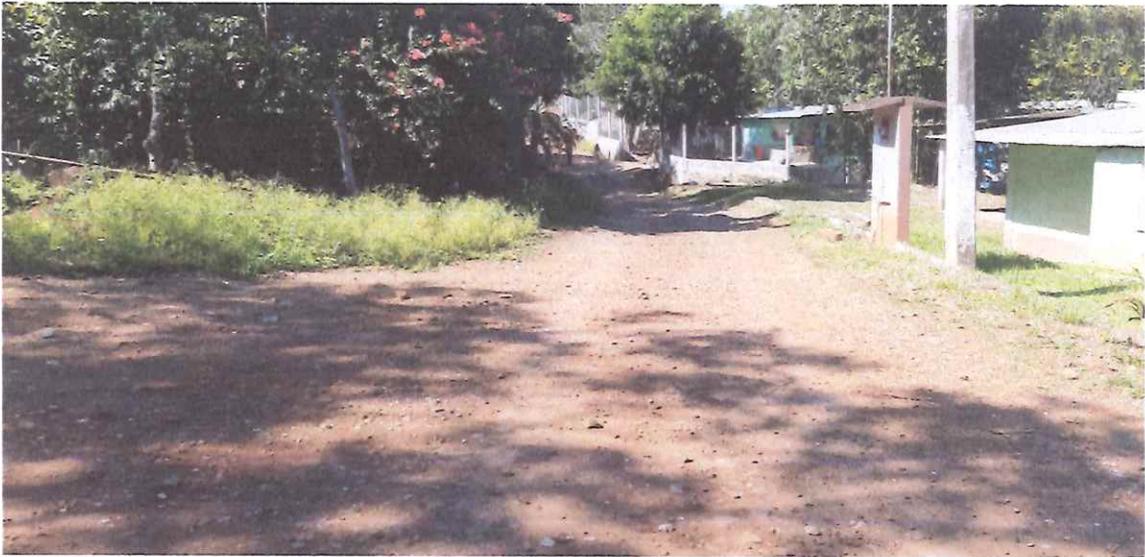

DESPUES

