

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIAN
DE LA EMPRESA AL H. AYUNTAMIENTO**

EN EL MUNICIPIO DE ZENTLA, VER. SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DÍA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023. REUNIDOS EN LA LOCALIDA DE TENANZINTLA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ZENTLA, VER.

POR PARTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL Y H. AYUNTAMIENTO:

C.C. DR. RAFAEL LÓPEZ HERNÁNDEZ, L.C. LEONARDO ANDRÉS VALDIVIA BERISTAIN, ING. BERNARDINO ACOSTA LÓPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, CONTRALOR MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, RESPECTIVAMENTE.

Y POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA:


ING. LORENZO GONZÁLEZ SÁNCHEZ


CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

“REHABILITACION DE CAMINOS RURALES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO MIXTO, EN LA LOCALIDAD DE TENANZINTLA”

DATOS DE LA OBRA:

NUMERO DE LA OBRA: 2023302000012	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: (B)		
	(A) ADJUDICACIÓN DIRECTA	(B) INVITACIÓN RESTRINGIDA	(C) LICITACIÓN PUBLICA
	CALENDARIO DE OBRA		
MONTO DEL CONTRATO: \$ 1,115,619.54	PROGRAMADA	FECHA DE INICIO 15/JUNIO/2023	FECHA DE TERMINO 12/SEPTIEMBRE/2023
MONTO DEL CONVENIO \$ 55,207.66	REAL	15/JUNIO/2023	31/AGOSTO/2023
MONTO TOTAL: \$1,170,827.20	CONVENIO MODIFICATORIO: 01-MVZ-DOP-009-FAISMUND-2023/0012 FECHA: 04/AGOSTO/2023		
NO. DE CONTRATO:	TIPO DE FIANZA: VICIOS OCULTOS		
MZV-DOP-009-FAISMUN- 2023/0012	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V, GRUPO FINANCIERO ASERTA		
	NUMERO DE FIANZA:		




INVERSIÓN:

Inversión aprobada				Inversión aplicada			
TOTAL	FAISMUN 2023	MPAL.	COM.	TOTAL	FAISMUN 2023	MPAL.	COM.
\$ 1,170,827.20	\$ 1,170,827.20	\$0.00	\$0.00	\$ 1,170,827.20	\$1,170,827.20	\$0.00	\$0.00



OBRA: "REHABILITACION DE CAMINOS RURALES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO MIXTO, EN LA LOCALIDAD DE TENANZINTLA"

"PAVIMENTO MIXTO EN CAMINOS RURALES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO MIXTO, EN LA LOCALIDAD DE TENANZINTLA"

CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD
	PRELIMINARES		
PRE-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO A BASE DE LONA IMPRESA CON LOGO DEL AYUNTAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, CON UNA SECCIÓN DE 1.00 X 1.50 MTS. FIJADA EN OBRA CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12.	PZA	1.00
PRE-002	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.	M ²	1,010.00
	CONCRETO		
COM-001	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 50 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M ³	404.00
	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA CON MÁQUINA Y DESCARGA A VOLTEO.	M ³	505.00
COM-003	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO.	M ³ /KM	2,525.00
COM-004	COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL CON EQUIPO MECANICO EN EL AREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES, AL 95 % DE SU PVSM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M ³	161.60
COM-005	BASE HIDRAULICA 70 - 30 % (GRAVA 1 1/2" - CEMENTANTE) DE 20 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95 % DE SU PVSM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M ²	808.00
COM-006	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 20 CM. DE ESPESOR, F'C= 250 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MÁXIMO 3/4", VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA, INCLUYE VIBRADO Y CURADO	M ²	575.20
COM-007	CONCRETO CICLOPEO (60 - 40) CON PIEDRA BRAZA LIMPIA Y CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREOS A 1A. ESTACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M ²	231.60
COM-008	CORTE CON DISCO DE 6.35 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	268.00
COM-009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS DE DILATACIÓN PARA CALAFATEO DE 10 MM. DE ANCHO Y 25 MM. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	268.00


CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD
COM-010	ELABORACIÓN DE DENTELLÓN DE 15 X 20 CM, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMEX 15 X 20-4, INCLUYE, CIMBRA DESCIMBRA, ACABADO COMÚN, MANO DE OBRA EQUIPO NECESARIO, MATERIALES, ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN A 20.00 M.	ML	4.00
	GUARNICIONES Y BANQUETAS.		
GYB-001	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL TIPO III, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: APILE DEL MATERIAL EN EL LUGAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M ³	33.25
GYB-002	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2., DE 15 X 20 X 50 CM. DE SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	237.50
GYB-003	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M ³	7.13
GYB-004	NIVELACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE ÁREA PARA DESPLANTE DE BANQUETA. INCLUYE INCORPORACIÓN DE AGUA PARA SU COMPACTACIÓN.	M ²	195.70
GYB-005	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M ²	195.70
GYB-006	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINÍLICA EN GUARNICIONES DE 15CM DE CORONA Y 30 CM DE ALTURA,, INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	237.50
GYB-007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE TERMINACIÓN DE OBRA EN ALUMINIO IMPRESO TAMAÑO CARTA. INCLUYE: FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
	EXTRAORDINARIOS		
EXTR001	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REVENIMIENTO DE 10 CM., VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES EN,PASO PEATONAL INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	4.77


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL COMITÉ COMUNITARIO QUIEN SE COMPROMETE A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA.


EL ACTO DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA DE LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL H. AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE POR DERECHO LE CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS 13:00 HRS DEL DIA CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EN DOS TANTOS, DONDE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE TODAS LAS FOJAS QUIENES INTERVINIERON EN ELLA, DAMOS FE:

ENTREGA:

EL CONTRATISTA

ING. LORENZO GONZALEZ SANCHEZ
(PERSONA FISICA)




RECIBEN:

POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL Y H. AYUNTAMIENTO



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ZENTLA, VER.
2022-2025



DR. RAFAEL LÓPEZ HERNÁNDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZENTLA, VER.




CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO
ZENTLA, VER.
2022-2025

L.C. LEONARDO ANDRÉS VALDIVIA BERISTAIN
CONTRALOR MUNICIPAL




OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
ZENTLA, VER.
2022-2025

ING. BERNARDINO ACOSTA LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRAFICO

ANTES

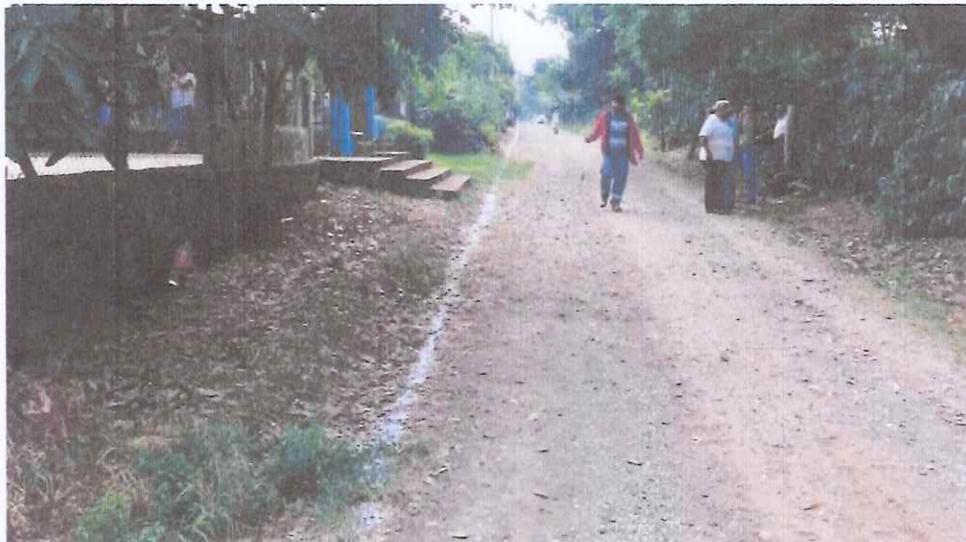


REPORTE FOTOGRAFICO

DESPUES




TRA



MIGUEL REBOLLEDO No 109 TEL. 228 8 16 87 40
Email: ingenieriydesarrollo10@gmail.com
COATEPEC, VER



REPORTE FOTOGRAFICO DESPUES



REPORTE FOTOGRAFICO
DESPUES



Handwritten blue scribble or signature.



Handwritten blue scribble or signature.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.
